

[標準様式 6 - 2]

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 5 月 1 5 日
契約業者名	五洋建設株式会社 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工事の名称	伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事
工事場所	富山市東岩瀬町字海岸通地内、射水市堀岡新明神地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するものである。
工期 (自)	令和 6 年 8 月 2 0 日
工期 (至)	令和 7 年 5 月 1 6 日
変更前の契約金額	4 3 5 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5 3 6 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致により、構造物撤去工、舗装工、仮設工及び共通仮設費に変更が生じたため。 2. 荒天リスク精算型の供用係数ランクが確定したため。 3. 休日確保評価型(工期指定)の補正係数が確定したため。 4. 快適トイレ、遠隔臨場及び諸経費検証モデルの履行が確定したため。 5. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【北陸地方整備局 港湾空港部】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和7年 5月15日	伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事	2億円	5億円	富山県	R6.8.20~ R7.5.16	本工事は、伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)の撤去工、床堀工、基礎工、舗装工、防食工、本体工、仮設控工及び付工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの	・施工条件の現状不一致	・能登半島地震の影響により資材調達場所等の施工方法の変更が必要となったため。 ・船舶規格や船舶帰港ルートが変更となるため。	・不測の事態でありやむを得ないが、今後は事前予測を高めてほしい。

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

- 令和6年度 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事 請負者:五洋建設(株)
 工事場所:富山市東岩瀬町字海岸通地内、射水市堀岡新明神地先 工期:R6.8.20~R7.5.16


本工事は、伏木富山港富山地区の岸壁(撤去工、床掘工、基礎工、舗装工、防食工、本体工、仮設控工、付工)を施工するものである。

位置図

伏木富山港(富山地区)



標準断面図

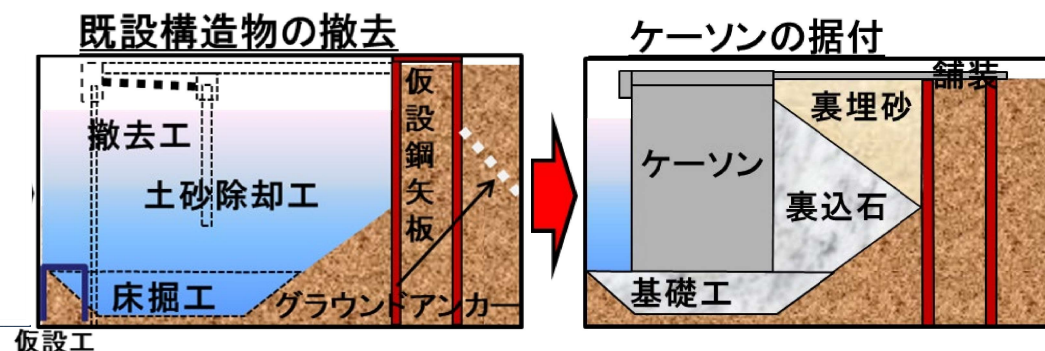

第三者チェックの該当項目

- ・変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・基礎工 捨石調達の代替地の追加、施工方法の見直し
- ・床掘工(作業船の変更)

工事変更の理由

- ・基礎捨石を安定的に確保するため、追加で調達先の代替地を確保し、運搬・投入の施工方法を変更。
- ・当初想定 of 浚渫船が他工事に従事しており代替船に変更。



基礎工の施工状況



床掘工の施工状況
