

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 0 日
契約業者名	五洋・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 5 号
工事の名称	飯田港(飯田地区)岸壁(-5.5m)(災害復旧)改良外 1 件工事
工事場所	飯田港 (飯田地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 3 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	9 0 6 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 1 0 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 , 0 1 6 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致に伴い、数量を変更するため。 2. 計画変更に伴い、臨港道路を追加するため。 3. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧


【北陸地方整備局 港湾空港部】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年 3月10日	飯田港(飯田地区)岸壁(-5.5m)(災害復旧)改良外1件工事	9億円	17億円	石川県珠洲市飯田町地先	R7.10.23~ R8.3.27	本工事は、岸壁(-5.5m)の本体工、上部工、舗装工、付属工を、護岸の本体工、上部工、舗装工、付属工を施工するものである。	・工事の区分の追加	・臨港道路の復旧の追加 ・岸壁両端部の施工方法の確定	・中詰材の効率的な運搬ルートを確認するため、公共本線及び公共支線2号を追加し、一体的に施工する。	・特に意見なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

- 飯田港(飯田地区)岸壁(-5.5m)(災害復旧)改良外1件工事 請負者:五洋・本間JV
- 工事場所:石川県珠洲市飯田地区地先 工期:R7.10.23~R8.3.27

本工事は、飯田港飯田地区の岸壁(-5.5m)の本体工、上部工、舗装工、付属工、護岸の本体工、上部工、舗装工、付属工を施工するものである。

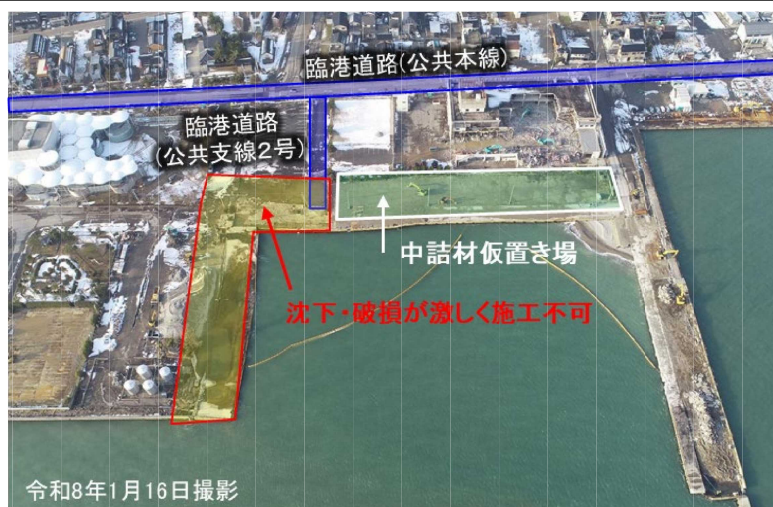

岸壁(-5.5m)周辺の復旧状況



第三者チェックの該当項目

・工事の区分の追加


工事変更の内容

- ・臨港道路の復旧の追加
- ・岸壁両端部の施工方法の確定

工事変更の理由

・中詰材の効率的な運搬ルートを確保するため、公共本線及び公共支線2号を追加し、一体的に施工する。

飯田港 臨港道路

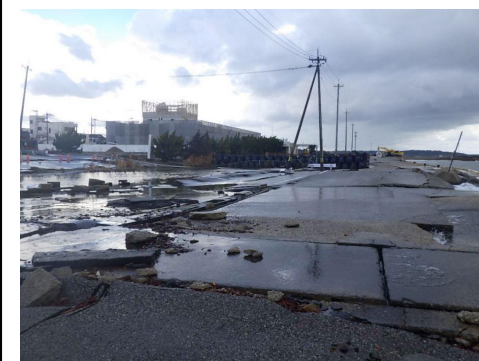

臨港道路周辺の破損状況
