

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	株式会社本間組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区西湊町通三ノ町 3 3 0 0 番地 3
工 事 の 名 称	飯田港(飯田地区)東防波堤(災害復旧)撤去工事
工 事 場 所	飯田港飯田地区、飯田港上戸地区及び野々江地区、七尾港大田岸壁、津向地区及び矢田新地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 4 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 計画変更に伴い、施工施設の追加及び工期を延伸するため。 2. 現状不一致に伴い、数量を変更するため。 3. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【北陸地方整備局 港湾空港部】


契約変更年 月日	工事の名称	変更前の契 約金額	変更後の契 約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェッ クの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年 3月10日	飯田港(飯田地区)東防波 堤(災害復旧)撤去工事	3億円	8億円	石川県珠洲 市飯田町地 先	R7.8.4～ R8.3.16	本工事は、飯田港飯田地 区の東防波堤(構造物撤 去工)を施工するものであ る。	・変更見込金額 の合計が当初の 請負代金額以上 となるもの ・工事の区分の 追加	・飯田港海岸護岸等の 復旧の追加 ・飯田港東防波堤(消波 ブロック堤)の追加	・本工事撤去工と連携した一 体的な施工が可能であり、 飯田港海岸の護岸を追加す る。 また、東防波堤の撤去工と 復旧する基礎工・消波工等 が輻輳しないよう一体的な 施工を行う。	・特に意見なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容(飯田港・飯田港海岸)

- 飯田港(飯田地区)東防波堤(災害復旧)撤去工事 請負者:本間組
- 工事場所:石川県珠洲市飯田地区地先 工期:R7.8.4~R8.3.31

本工事は、飯田港飯田地区の東防波堤(構造物撤去工)を施工するものである。

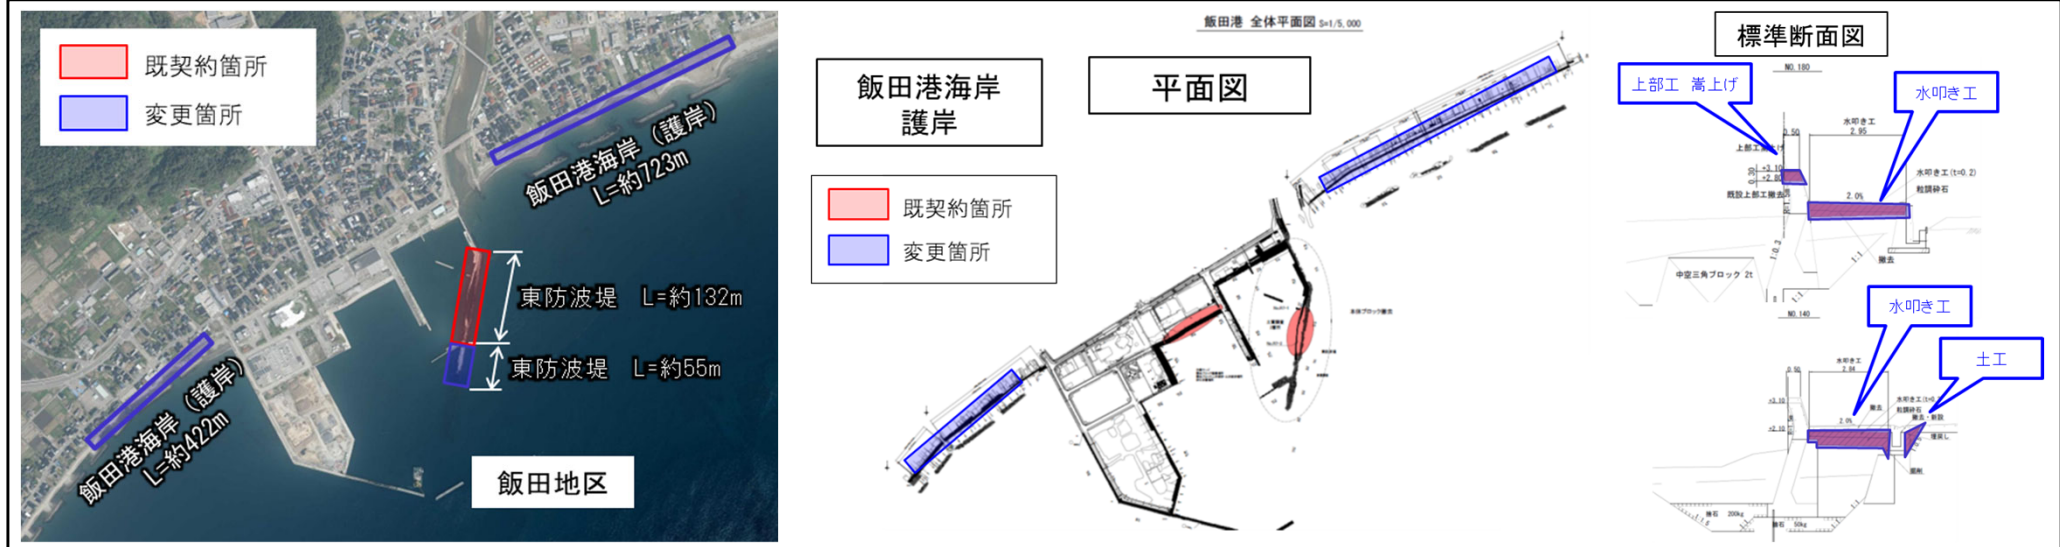

第三者チェックの該当項目

- ・変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの
- ・工事の区分の追加

工事変更の内容

- ・飯田港海岸護岸等の復旧の追加
- ・飯田港東防波堤(消波ブロック堤)の追加

工事変更の理由

- ・本工事撤去工と連携した一体的な施工が可能であり、飯田港海岸の護岸を追加する。また、東防波堤の撤去工と復旧する基礎工・消波工等が輻輳しないよう一体的な施工を行う。

飯田港海岸 護岸



護岸の一部の沈下や護岸水叩きの破損が顕著
