

## (第 4 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 4 日
契約業者名	福田道路株式会社 新潟本店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町一丁目 5 3 番地 1
工事の名称	能登空港滑走路外(災害復旧)改良工事
工事場所	石川県鳳珠郡穴水町 能登空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	現在履行中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	9 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 7 3 8 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 , 6 9 0 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 設計変更に伴い、指定部分工期を追加するため。 2. 現状不一致に伴い、能登空港のエプロン、滑走路(レベリング層・基層・ショルダー(レベリング層・基層))、駐車場に変更が生じたため。 3. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。

## 令和7年度 工事契約変更審査委員会 対象工事一覧

【北陸地方整備局 港湾空港部】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年 3月4日 【一部の追加変更】	能登空港滑走路外(災害復旧)改良工事	10億円	22億円	石川県輪島市、穴水町、能登町	R6.11.22～ R8.3.27	本工事は、能登空港(滑走路、誘導路、エプロン、場周道路、場周柵、排水溝、管理用道路、調整池、道路、駐車場)において舗装撤去工、空港舗装工、空港標識工、空港土工、付帯施設工、舗装工、道路付属物施設工、緑地工、構造物撤去工、小型水路工、仮設工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの	・滑走路(滑走路等舗装内埋設灯火設備含む)、着陸帯、保安道路、小型機誘導路、消防水利施設の追加	・早期本復旧に目指すうえで技術者、施工機材、作業員の不足が課題であり、既存契約に未契約区域を追加することで、技術者、施工機材、作業員(宿泊施設含む)が確保され、一体で効率的な施工が可能となるため。	・特に意見なし
令和8年 3月4日	能登空港滑走路外(災害復旧)改良工事	10億円	22億円	石川県輪島市、穴水町、能登町	R6.11.22～ R8.3.27	本工事は、能登空港(滑走路、誘導路、エプロン、場周道路、場周柵、排水溝、管理用道路、調整池、道路、駐車場)において舗装撤去工、空港舗装工、空港標識工、空港土工、付帯施設工、舗装工、道路付属物施設工、緑地工、構造物撤去工、小型水路工、仮設工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの	・施工条件の現状不一致	・資材不足による施工能力の低下が生じたため ・As合材の輸送費用が増加したため。 ・As殻の輸送費用が増加したため。	・能登半島地震の復旧全体は多くの資材が必要となるので仮設プラントの建設を考えると良い。



# 第三者適正性チェックの内容(能登空港)

- 能登空港滑走路外(災害復旧)改良工事 請負者:福田道路株式会社  
 工事場所:石川県輪島市・穴水町・能登町 工期:R6.11.22~R7.12.12

## 工事概要

能登空港(滑走路、誘導路、エプロン、場周道路、場周柵、排水溝、管理用道路、調整池、道路、駐車場)の以下の工種を施工するものである。

舗装撤去工、空港舗装工、空港標識工、空港土工、付帯施設工、舗装工、道路付属物施設工、緑地工、構造物撤去工、小型水路工、仮設工

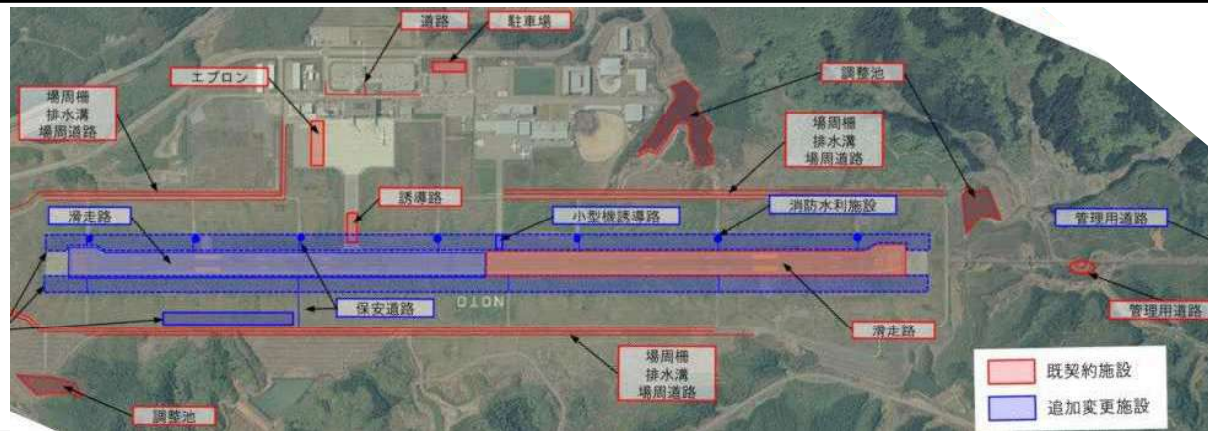

### 第三者チェックの該当項目

変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの

### 工事変更の内容

- ・滑走路(滑走路等舗装内埋設灯火設備含む)、着陸帯、保安道路、小型機誘導路、消防水利施設の追加

### 工事変更の理由

- ・早期本復旧に目指すうえで技術者、施工機材、作業員の不足が課題であり、既存契約に未契約区域を追加することで、技術者、施工機材、作業員(宿泊施設含む)が確保され、一体で効率的な施工が可能となるため。

