

[標準様式 6 - 2]

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契 約 業 者 名	東洋・本間特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工 事 の 名 称	穴水港(大町地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良外 1 件 工事
工 事 場 所	鳳珠郡穴水町大町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記 述する)	現在履行中の本工事を設計図書に基づき変更するもので ある。
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 8 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 0 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 , 5 6 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現状不一致に伴い、構造物撤去工、本体工、上部工、 舗装工、付属工、防食工、付工及び臨港道路の数量を変更 するため。 2. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【北陸地方整備局 港湾空港部】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年 3月30日	穴水港(大町地区)物揚場 (-4.0m)(災害復旧)改良外 1件工事	5億円	15億円	石川県鳳珠 郡穴水町大 町地先	R7.2.20～ R8.3.30	本工事は、物揚場の構造物撤去工、裏埋工、本体工、上部工、舗装工、付属工、防食工を、臨港道路の構造物撤去工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工を施工するものである。	・変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの	・舗装工及び上部工のPCa化 ・作業船の回航費の追加	・早期供用の地元要請が高く、工期短縮のため、舗装工及び上部工をプレキャスト化に変更。 ・当初未計上であった本体工(基礎工先行掘削を含む)の作業船の回航費の追加変更。	・特に意見なし


※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

- 穴水港(大町地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良外1件工事 請負者:東洋・本間JV
工事場所:石川県鳳珠郡穴水町大町地先 工期:R7.2.20~R8.3.30

本工事は、穴水港大町地区の物揚場(構造物撤去工、裏埋工、本体工、上部工、舗装工、付属工、防食工の外、臨港道路(構造物撤去工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工)を施工するものである。



標準断面図

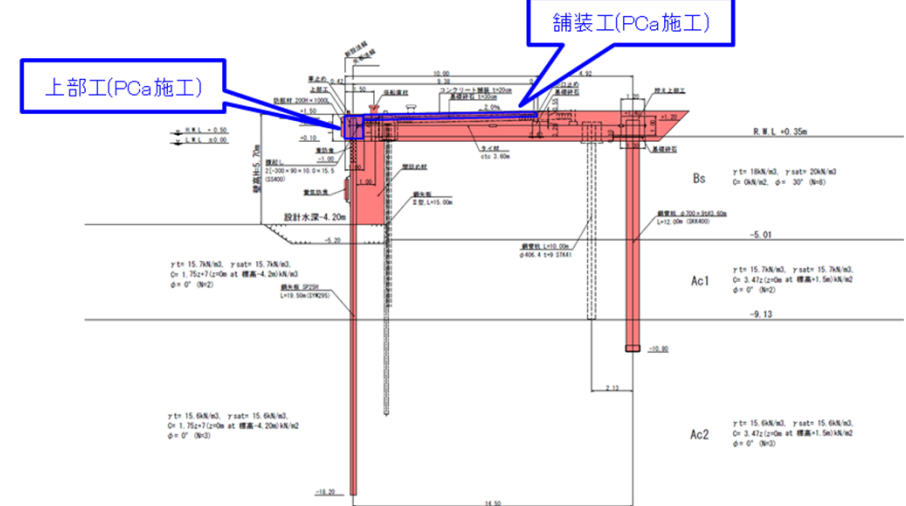

第三者チェックの該当項目

- ・変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・舗装工及び上部工のPCa化
- ・作業船の回航費の追加

工事変更の理由

- ・早期供用の地元要請が高く、工期短縮のため、舗装工及び上部工をプレキャスト化に変更。
- ・当初未計上であった本体工(基礎工先行掘削を含む)の作業船の回航費の追加変更。



鋼矢板の法線の出入りやエプロン部の沈下が顕著
