

(第 3 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 3 日
契約業者名	若築建設株式会社 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 3 号
工事の名称	宇出津港(宇出津地区)物揚場(-4.0m)(13号・14号)(災害復旧)改良外1件工事
工事場所	鳳珠郡能登町宇出津港地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものとする。
工期(自)	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
工期(至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変更前の契約金額	5 8 1, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1, 0 5 7, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 6 3 9, 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<p>1. 現状不一致による以下の工種の変更【物揚場(-4.0m)13号】・構造物撤去工、土工、地盤改良工、基礎工、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工【物揚場(-4.0m)14号】・構造物撤去工、基礎工、本体工(鋼矢板式)、本体工(場所打ち式)、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工、排水工、擁壁工、防食工、仮設工【臨港道路(藤波ふ頭線)】・構造物撤去工、土工、排水構造物工、舗装工、縁石工、仮設工・共通仮設費</p> <p>1. 計画変更による工期の変更</p> <p>1. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施</p>

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【北陸地方整備局 港湾空港部】


契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年 3月13日	宇出津港(宇出津地区)物揚場(-4.0m)(13号・14号)(災害復旧)改良外1件工事	6億円	12億円	石川県鳳珠郡能登町宇出津港地先	R6.11.18～ R8.3.16	本工事は、物揚場(-4.0m)(13号)の撤去工、基礎工、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工、地盤改良工を、物揚場(-4.0m)(14号)の撤去工、本体工、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工、防食工を、臨港道路(藤波ふ頭線・天保島ふ頭線の撤去工、土工、排水構造物工、舗装工、路側工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの	・物揚場(-4.0m)(13号)の地盤改良工の追加 ・臨港道路(天保島ふ頭線)の追加	・ケーソン傾斜、法線ズレに加え、目地部の損傷や裏込石部に敷設された防砂シートの破れ等が懸念され、背後地盤の吸い出し対策が必要となった。 ・臨港道路は、物揚場との一体施工により利用調整を行い施工する。	・被災した岸壁(重力式)を再使用する際は、吸い出しの可能性を考えて費用計上が望ましい。

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

- 宇出津港(宇出津地区)物揚場(-4.0m)(13号・14号)(災害復旧)改良外1件工事
 工事場所:石川県鳳珠郡能登町宇出津港地先 工期:R6.11.18~R8.3.16

請負者:若築建設

本工事は、宇出津港宇出津地区の2物揚場の構造物撤去工、基礎工、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工を施工するものである。

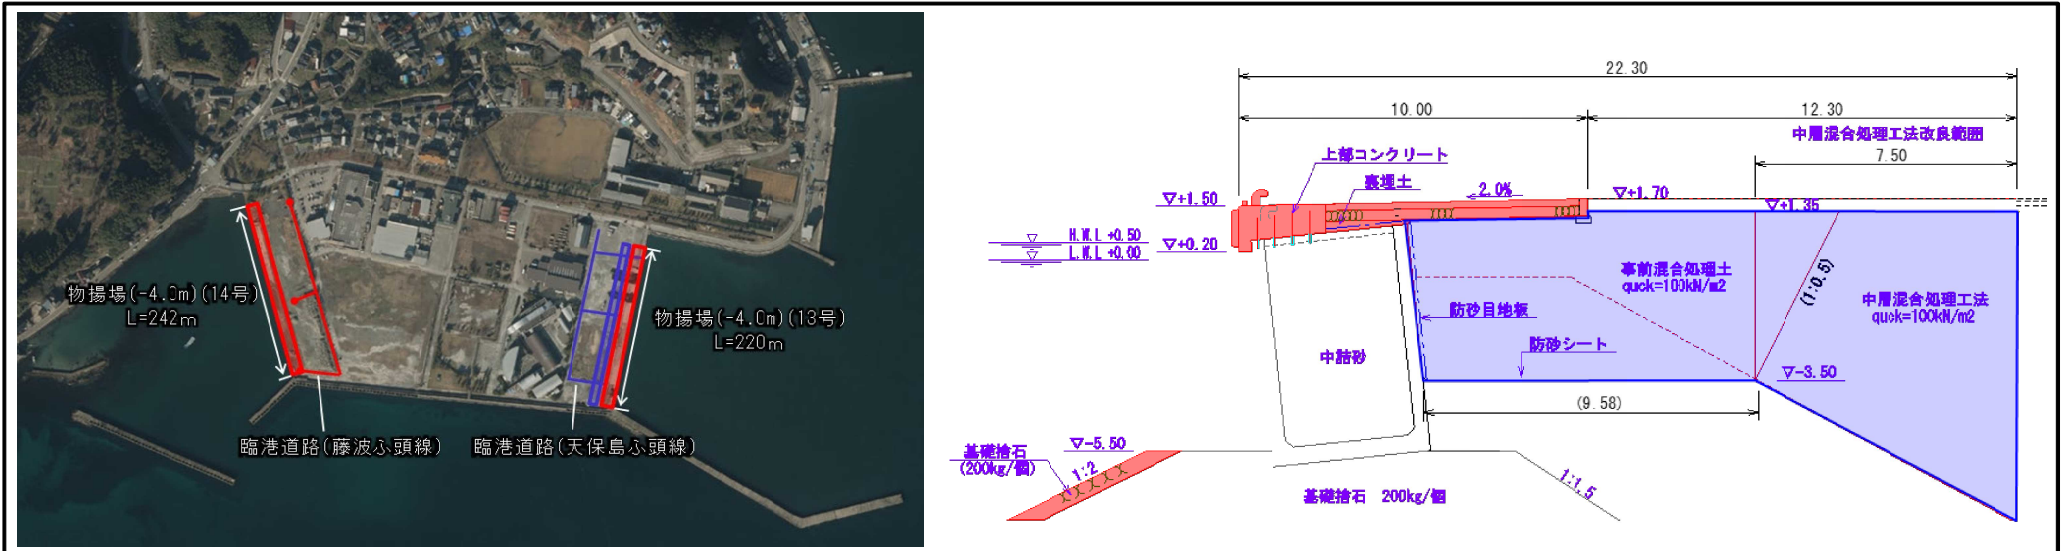

第三者チェックの該当項目	・変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの
工事変更の内容	・物揚場(-4.0m)(13号)の地盤改良工の追加 ・臨港道路(天保島ふ頭線)の追加
工事変更の理由	地震の被害としてケーソンの傾斜、法線のズレが発生しており、目地部の損傷や裏込石部に敷設された防砂シートの破れやめくれが懸念されることから、背後地盤の吸い出し対策が必要となった。

