

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 4 日
契約業者名	東洋・本間・あおみ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工事の名称	金沢港(南地区)岸壁(-10m)(戸水1号・2号)(災害復旧)改良外1件工事
工事場所	金沢市戸水町地内、金沢市大野町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
工期(至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2, 9 4 6, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2, 3 8 1, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5, 3 2 8, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<p>1. 現状不一致による以下の工種の変更 【戸水1号】・撤去工、土工、本体工、裏埋工、上部工、付属工、舗装工、仮設工【戸水2号】・撤去工、土工、本体工、裏埋工、上部工、付属工、舗装工、陸上地盤改良工、仮設工【泊地】・土砂運搬工、仮設工 【岸壁(-10m)(御供田1号)】・撤去工、陸上地盤改良工、仮設工・共通仮設費</p> <p>2. 計画変更による工期の延伸</p> <p>3. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。</p>

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【北陸地方整備局 港湾空港部】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年 3月24日	金沢港(南地区)岸壁(-10m)(戸水1号・2号)(災害復旧)改良外1件工事	29億円	48億円	石川県金沢市戸水町地内	R6.10.17 ~ R8.3.25	本工事は、金沢港(南地区)岸壁(-10m)(戸水1号)の撤去工、土工、本体工(矢板式)、裏埋工、上部工(プレキャスト)、舗装工(半たわみ性舗装)及び付属工を、(戸水2号)の撤去工、土工、本体工(矢板式)、裏埋工、上部工(プレキャスト)、舗装工(プレキャスト)、地盤改良工及び付属工を、(御供田1号)の地盤改良工(一部)を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの	・2号岸壁の液状化対策のため地盤改良工を追加 ・上部工及び舗装工の施工方法を変更 ・岸壁(-10m)(御供田1号)の地盤改良工事の追加	・契約後に実施した土質調査の結果から設計見直しにより液状化対策(地盤改良)が必要となったため。 ・令和7年度内の完了を目指した工程短縮のため。 ・次復旧工事の利用制限を最小限にするため。	・発注前の土質調査で設計に反映が望ましいが、早期復旧も重要。




第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容(金沢港)

n 金沢港(南地区)岸壁(-10m)(戸水1号・2号)(災害復旧)改良外1件工事 請負者:東洋・本間・あおみ特定JV
 工事場所:石川県金沢市戸水町地内 工期:R6.10.17 ~ R8.3.25

工事概要

金沢港(南地区)岸壁(-10m)(戸水1号・2号)の以下の工種を施工するものである。
 【岸壁(-10m)(戸水1号)】撤去工、土工、本體工(矢板式)、裏埋工、上部工(プレキャスト)、舗装工(半たわみ性舗装)及び付属工
 【岸壁(-10m)(戸水2号)】撤去工、土工、本體工(矢板式)、裏埋工、上部工(プレキャスト)、舗装工(プレキャスト)、地盤改良工及び付属工

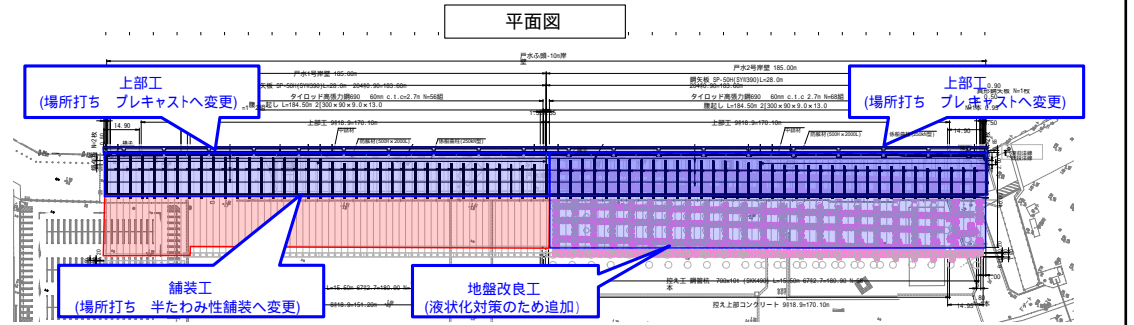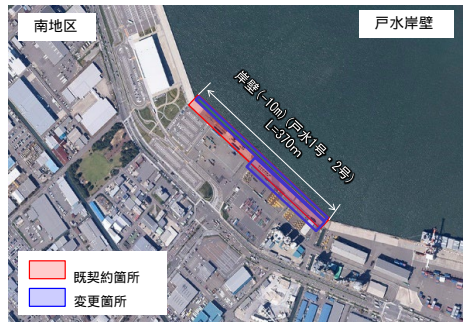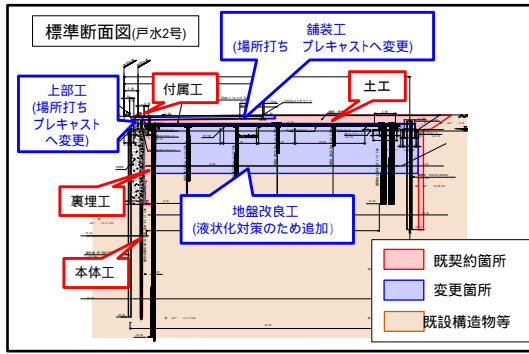

第三者チェックの該当項目

変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

2号岸壁の液状化対策のため地盤改良工を追加
 上部工及び舗装工の施工方法を変更
 岸壁(-10m)(御供田1号)の地盤改良工事の追加

工事変更の理由

契約後に実施した土質調査の結果から設計見直しにより液状化対策(地盤改良)が必要となったため。
 令和7年度内の完了を目指した工程短縮のため。
 次復旧工事の利用制限を最小限にするため。

